


Kolik stojí CIIRC?

Jan Kybic, 29.3.2017

Kolik bude stát budova JP (ČVUT-CIIRC)

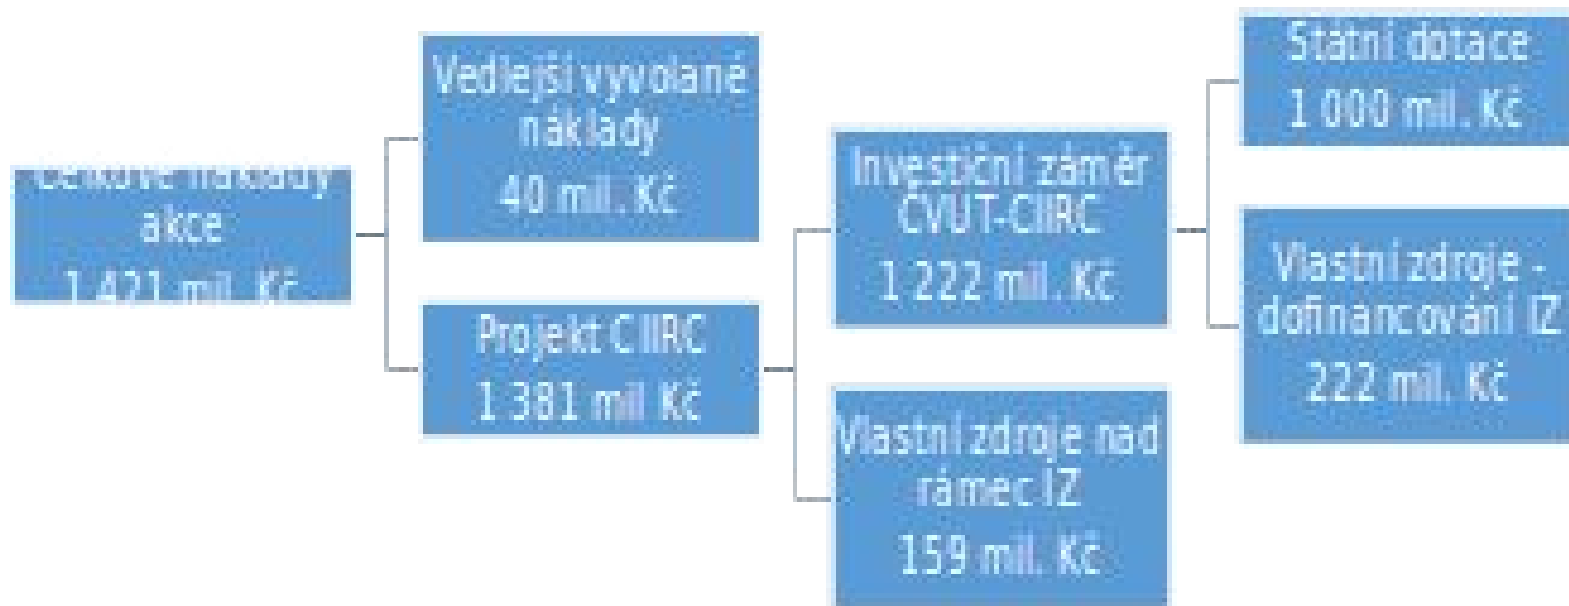

- nezahrnuje DPH (+203mil.Kč), bude vrácena
- **nezahrnuje** náklady na přestěhování FEL a VIC (odhad 46mil. Kč)

Snížení státní dotace

Souhrn za SR INV ✓	0,00	604 212 994,00	395 787 006,00	0,00	1 000 000 000,00 ✓
Souhrn za SR ✓	0,00	604 212 994,00	395 787 006,00	0,00	1 000 000 000,00 ✓
Souhrn za SR a alokace EU	0,00	604 212 994,00	395 787 006,00	0,00	1 000 000 000,00
Souhrn zdrojů ✓	23 248 462,00	825 443 647,00	533 019 768,00	0,00	1 381 711 877,00 ✓

z rozhodnutí MŠMT o poskytnutí dotace ze dne 16.3.2015

Náklady z vlastních zdrojů ČVUT

- v nejlepším případě $1421 - 1000 = 421$ mil.Kč
- v nejhorším případě $1421 + 203 = 1624$ mil.Kč
- realistický odhad $1421 - 604 + \dots =$ cca **900 mil.Kč**
- roční náklady na provoz cca **40 mil.Kč** (+garáže?)

Neznámé:

- Bude DPH opravdu vrácena?
- Dostane ČVUT od státu slíbenou částku? Dostane ČVUT na investice v budoucnu méně peněz?
- Na jaké další dodatečné a vyvolané náklady se zapomnělo?

Jak byl informován AS ČVUT

- *Nepotřebujeme finance z rozpočtu ČVUT.* Prof. Mařík, 24.4.2013
- *CIIRC v rozpočtu být nemůže. Ještě ani nevíme, zdali dostaneme dotace.* rektor, 25.6.2014
- *Vzhledem k tomu, že MŠMT nemělo dostatek prostředků, byly poskytnuty peníze ze státního rozpočtu.* rektor, 24.6.2015 [září 2014]
- *Ze systémových důvodů bylo převedeno financování z VaVpl na financování ze zvláštních prostředků státního rozpočtu (díky panu rektorovi). Vláda přidělila ČVUT 1 mld. Kč na tento projekt.* prof. Mařík, 17.12.2014
- *Byla podepsána smlouva se stavební firmou. ČVUT bude platit $(1378-215) \cdot 10.2\% = 119 \text{ mil. Kč}$.* rektor, 22.10.2014.
- *O financování ještě není rozhodnuto. Projekt jako takový nás bude stát **164 mil. Kč** kompletně... Od 1. ledna 2017 by měli být schopni [CIIRC] se sami zaplatit.* rektor, 26.11.2014
- *Máme kofinancování ve výši **170 mil. Kč** z vlastních prostředků.* rektor 24.6.2015

Skutečnost: minimálně 421mil.Kč.

Prostory aneb *Cui bono?*

- Z celé budovy, která se staví, obsazuje CIIRC zhruba 47 % plochy. rektor 25.11.2015
- aktualizovaný investiční záměr z 14.10.2016:

Plánované plochy dle uživatelů jsou rozděleny v následující tabulce:

Subjekt	Pracovny a doplňkové plochy	Ostatní, technické a komunikační plochy	Celková plocha
FEL	1 398	544	1 942
CIIRC	17 216	9 720	26 936
REKTORÁT	2 044	1 000	3 044
VIC	585	32	617
Celková plocha	21 243	11 295	32 538

cca **80%**

- FEL, rektorát i VIC přicházejí o své prostory v Zikově ulici

Z čeho zaplatit budovu

- *Záporný zůstatek FRIMu byl doplněn informací o dorovnání z prodeje nemovitostí. rektor, 1.7.2015*
- *Konvalinka: Převedeme do fondu tolik prostředků, aby tam ten mínus nebyl. Jex: A odkud se ty prostředky vezmou? Konvalinka: To já nevím, to je věc kvestora. zasedání AS, 25.11.2015*
- *F. Hrdlička: všechny FRIMy nedávají dohromady prostředky potřebné k dofinancování výstavby budovy ČVUT-CIIRC...Jako jedno z možných řešení je úvěr, který by musel AS ČVUT schválit. zasedání AS, 25.5.2016.*
- *Akademický senát ČVUT žádá vedení ČVUT o zpracování materiálu týkající se úhrady záporného zůstatku k 31. 12. 2016 na FRIM, středisko škola, popř. dalších výdajů v souvislosti s výstavbou budova ČVUT-CIIRC,... usnesení AS z 25.5.2016*
- *s [vyňatými prostory] však nemá CIIRC nic společného... prof. Mařík, vyjádření pro AS, ze dne 27.6.2016*

Finanční potíže ústavu CIIRC

- Mzdové prostředky z projektu VaVpl se nepodařilo získat.
- 37 mil.Kč z **dotace 2009** (104mil.Kč) na podporu projektového a výzkumného týmu.
- *hrozí porušení rozpočtové kázně*

prof. Mařík, dopis AS, ze dne 27.6.2016

- Určení této dotace (104 nebo 108mil.Kč) pro CIIRC není nijak podloženo.
- *AS ČVUT schvaluje navýšením příspěvku ČVUT pro CIIRC z FPP součásti ŠKOLA formou půjčky.*
26.10.2016
- CIIRC pravděpodobně nemá prostředky na provoz budovy JP.
- *Nebude-li se dařit, CIIRC půjde zrušit, ...* prof. Mařík, 24.4.2013

Závěr - budova JP

- O financování budovy i přes nezískání financování z projektu VaVpl **rozhodl rektor** podepsáním investičního záměru.
- Tento investiční záměr AS ČVUT neschválil ani neprojednával. Rektor ho odmítl AS poskytnout.
- Budova JP bude ČVUT stát nejméně **420mil.Kč**, možná i dvojnásobek, plus **40mil.Kč/ročně**.
- Finanční prostředky ČVUT (středisko Škola) jsou **vyčerpány**, chybí peníze na doplacení zbytku nákladů. **Rektor** není schopen předložit realistický plán řešení této krize.
- O celkové výši potřebného dofinancování informoval rektor AS **zavádějícím způsobem**.
- Z postavení nové budovy JP má prospěch pouze VŠ ústav CIIRC.

Závěr - ústav CIIRC

- Ústav CIIRC nezískal financování z projektu VaVpl, se kterým počítal, a kvůli kterému byl založen.
- Ústav CIIRC pokračoval v činnosti přes nezajištěné financování a začal masivně nabírat pracovníky.
- CIIRC utrácel více, než měl k dispozici. To je **selhání ředitele CIIRC**.
- **Rektor** podepsal investiční záměr, ve kterém se mluví o nutnosti podpory CIIRC ze strany ČVUT, aniž by měl pro tuto podporu zajištěné finanční zdroje. To je **selhání rektora**.
- Rektor i ředitel CIIRC učinili kroky mající závažný hospodářský dopad na celé ČVUT bez podpory ostatních součástí. Nyní se dovolávají jejich solidarity.
